



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0716-12

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	0716-12
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
IDENTIFICACION	:	91.426.010 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	ÁLVARO RAMÍREZ GARCÍA
IDENTIFICACION	:	13.817.869 de Bucaramanga
DELEGADO UIS	:	HERNAN PORRAS DIAZ
CARGO	:	DIRECTOR DEL PROYECTO UIS
OBJETO	:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL- BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012- 2015.
VALOR INICIAL	:	\$10.666.925.000
VALOR FINAL	:	\$10.846.925.000
SUPERVISION	:	JESSICA BARON GUARIN
APOYO TECNICO	:	ENILDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ. RES No 0028 DEL 25-09- 2012
PLAZO DE EJECUCION	:	DIECIOCHO (18) MESES
SUJECION PRESUPUESTAL	:	04-3-87311-01 Renovación y Mejoramiento Urbano 04-3-87211-01 y 04-3-87251-61 Implementación del Plan Maestro de Movilidad y Transporte.
PLAN DE COMPRAS No.	:	970 de agosto 13/2012; 1042, 1043 y 1044 de agosto 28/2012
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	3090 y 3024
FECHA DE INICIO	:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	26 DE MARZO DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No 1	:	SEIS (6) MESES – DEL 23 DE MARZO DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No 2	:	DOS (2) MESES –DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 3	:	\$180.000.000 – DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
ACTA DE SUSPENSION No 1	:	25 DE NOVIEMBRE DE 2014
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 1	:	19 DE DICIEMBRE DE 2014, (90) DÍAS
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 2	:	26 DE MARZO DE 2015, (60) DÍAS
FECHA REINICIO DESPUES DE LA AMPLIACION No 2 DE LA SUSPENSION. No. 1	:	25 DE MAYO DE 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN	:	27 DE MAYO DE 2015 (presente acta)

En Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: JESSICA BARON GUARIN, Secretaria de Infraestructura, como Supervisor,

[Firma]



ENILDO JIMENEZ GONZALEZ, Profesional Universitario, como apoyo Técnico; GERMAN GARCIA VERA, Director de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander y HERNAN PORRAS DIAZ, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del contrato interadministrativo No. 0716 del 28 de agosto de 2012.

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Barrancabermeja y la Universidad Industrial de Santander suscribieron el contrato interadministrativo 0716-12, el día 28 de agosto de 2012, cuyo objeto es: "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL- BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012- 2015".
2. Que el contrato interadministrativo 0716 de 2012, inicio sus actividades, según Acta de Inicio el día 27 de septiembre de 2012, con una plazo inicial de dieciocho (18) meses.
3. Que el día veintitrés (23) de marzo de 2014, se suscribe el Contrato adicional en plazo No 1, ampliando en seis (6) meses el plazo inicial.
4. Que el día veintiséis (26) de mayo de 2014, se suscribe el Acta de ajuste de mayores y menores cantidades de diseño No 1, en la que se establece las nuevas cantidades de referencia de diseño para cada uno de los productos y de los proyectos contemplados en el contrato interadministrativo, correspondientes a la compensación entre los valores de mayores y menores cantidades de diseño, de acuerdo al Anexo 01 de esta acta, y sin superar el valor inicial del contrato.
5. Que el día veinticinco (25) de septiembre de 2014, se suscribe el Contrato adicional en plazo No2, ampliando en dos (2) meses el plazo inicial, para un total de veintiséis (26) meses de ejecución del contrato interadministrativo.
6. Que el día veinte (20) de noviembre de 2014, se suscribe el Acta de ajuste de mayores y menores cantidades de diseño No 2, en la que se establece las nuevas cantidades de referencia de diseño para cada uno de los productos y de los proyectos contemplados en el contrato interadministrativo, correspondientes a la compensación entre los valores de mayores y menores cantidades de diseño, de acuerdo al Anexo 01 de esta acta, y sin superar el valor inicial del contrato.
7. Que el día veintiuno (21) de noviembre de 2014, se suscribe el Contrato Adicional en valor No 3, en el que se incluye al alcance inicial producto No. 12 "Estudio urbanístico para el acondicionamiento de las áreas inundables, el estudio bioclimático preliminar y el amoblamiento interior complementario del Equipamiento" del proyecto "P3. Diseños arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería para el Malecón del Río Grande de La Magdalena, y de áreas para equipamientos públicos sobre este corredor", con un valor adicional de Ciento ochenta millones de pesos (\$180.000.000).

[Firma]



8. Que el día veinticinco (25) de noviembre de 2014, se suspende las actividades del contrato interadministrativo, por un término de treinta (30) días calendario, soportado en la solicitud presentada por la Universidad de esta fecha.
9. Que el día diecinueve (19) de diciembre de 2014, en vista que los motivos de la suspensión no se habían superados, se suscribe la Ampliación No.1 de la Suspensión No.1 por un plazo de noventa (90) días adicionales.
10. Que el día veintiséis (26) de marzo de 2015, en vista que los motivos de la suspensión no se habían superados, se suscribe la Ampliación No.2 de la Suspensión No.1, por un plazo de sesenta (60) días adicionales.
11. Que el día veinticinco (25) de mayo de 2015, se suscribe el acta de reinicio de actividades, una vez superados los motivos por los cuales se suspendieron las actividades del contrato interadministrativo 0716-12, el día veinticinco (25) de noviembre de 2014.
12. Que la Universidad ha hecho entrega de cada uno de los productos de los alcances de los estudios del contrato interadministrativo 0716-12, y sus respectivos Contratos Adicionales, soportado en las cantidades de referencia fijadas en las Actas de Ajuste por Mayores y Menores Cantidades de Diseño.
13. Que el valor del acta final es de Mil trescientos cuarenta y cinco millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos (**\$ 1.345.992.428**), cuyo valor neto después de amortización es de Setecientos sesenta y dos millones novecientos noventa y seis mil doscientos catorce pesos (**\$ 762.996.214**), como se relaciona en el Anexo 01, a la presente acta.

Valor Ejecutado Acta de Recibo Final	\$ 1.345.992.428
Menos Amortización Anticipo	\$ 582.996.214
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final	\$ 762.996.214

14. Que dadas las razones expuestas anteriormente,

ACUERDAN

1. Dar por recibido los productos del alcance del contrato interadministrativo 0716 de 2012.
2. Autorizar el pago del Acta de Recibo Final por un valor neto Setecientos sesenta y dos millones novecientos noventa y seis mil doscientos catorce pesos (\$ 762.996.214).
3. Fijar como fecha de terminación del contrato interadministrativo 0716-12, el día 27 de mayo de 2015.



4. Que el Municipio de Barrancabermeja en la ejecución de las obras, si llegare a presentarse alguna solicitud de aclaración la elevara a la Universidad Industrial de Santander (UIS) con el fin que sea aclarada.

Para constancia, se firma la presente acta por parte de los asistentes, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

JESSICA BARON GUARIN

Secretaria de Infraestructura- Supervisor
Municipio de Barrancabermeja

GERMAN GARCIA VERA

Director Escuela de Ingeniería Civil
Universidad Industrial de Santander

ENILDO JIMENEZ GONZALEZ

Profesional Universitario- Apoyo Técnico
Municipio de Barrancabermeja

HERNAN PORRAS DIAZ

Director del Proyecto
Universidad Industrial de Santander

Vo.Bo. A. González - A. Contables

Vo.Bo. Diana L. - A. Jurídicos




ACTA DE RECIBO FINAL ANEXO 01.


Proyecto	Producto	Valor Condición Inicial	Valor Acta Mayores y Menores Cantidades No 2	Adicional en Valor No 3	Valor Actualizado a la fecha	Valor Acumulado a Acta 05	Valor Acta Final	Valor Acumulado Acta Final
P1. Optimización y diseño del sistema vial del sector comprendido por la intersección de la Avenida del Ferrocarril con la carrera 28 y la diagonal 49, y su articulación con el corredor de la calle 52 hasta la carrera 34C y Carrera 34C entre calles 52 y 52A	1 Topografía	\$ 47.711.021	\$ 59.692.073		\$ 59.692.073	\$ 59.692.073	\$ 0	\$ 59.692.073
	2 Movilidad y tránsito	\$ 116.413.090	\$ 162.978.326		\$ 162.978.326	\$ 162.978.326	\$ 0	\$ 162.978.326
	3 Diseño Geométrico	\$ 109.030.428	\$ 109.030.428		\$ 109.030.428	\$ 109.030.428	\$ 0	\$ 109.030.428
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 502.556.732	\$ 571.658.283		\$ 571.658.283	\$ 571.658.283	\$ 0	\$ 571.658.283
	5 Geotecnia	\$ 154.564.906	\$ 154.564.906		\$ 154.564.906	\$ 154.564.906	\$ 0	\$ 154.564.906
	6 Diseño Estructural	\$ 242.548.527	\$ 347.030.969		\$ 347.030.969	\$ 347.030.969	\$ 86.757.743	\$ 347.030.969
	7 Redes de servicios	\$ 226.684.432	\$ 258.665.752		\$ 258.665.752	\$ 258.665.752	\$ 0	\$ 258.665.752
	8 Pavimentos	\$ 68.546.510	\$ 68.546.510		\$ 68.546.510	\$ 68.546.510	\$ 0	\$ 68.546.510
	9 Plan Manejo de Tránsito	\$ 45.932.702	\$ 45.932.702		\$ 45.932.702	\$ 45.932.702	\$ 0	\$ 45.932.702
	10 Lineamientos Ambientales	\$ 67.695.600	\$ 67.695.600		\$ 67.695.600	\$ 67.695.600	\$ 0	\$ 67.695.600
	11 Presupuesto, Especificaciones	\$ 89.129.547	\$ 89.129.547		\$ 89.129.547	\$ 89.129.547	\$ 0	\$ 89.129.547
	12 Gestión Social y Predial	\$ 233.027.005	\$ 233.027.005		\$ 233.027.005	\$ 233.027.005	\$ 0	\$ 233.027.005
Suma proyecto:		\$ 1.903.840.500	\$ 2.167.952.100		\$ 2.167.952.100	\$ 2.081.194.357	\$ 86.757.743	\$ 2.167.952.100
P2. Optimización y diseño del sistema vial del sector de la diagonal 60, y sus intersecciones con la calle 65, 66D (sector obras públicas) y la carrera 34b (Postobon); y La calle 61 entre carreras 34b y 33, y carrera 33 entre calles 61 y 60	1 Topografía	\$ 39.365.291	\$ 45.178.222		\$ 45.178.222	\$ 45.178.222	\$ 0	\$ 45.178.222
	2 Movilidad y tránsito	\$ 116.731.988	\$ 116.731.988		\$ 116.731.988	\$ 116.731.988	\$ 0	\$ 116.731.988
	3 Diseño Geométrico	\$ 85.622.316	\$ 85.622.316		\$ 85.622.316	\$ 85.622.316	\$ 0	\$ 85.622.316
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 501.939.513	\$ 325.820.386		\$ 325.820.386	\$ 325.820.386	\$ 0	\$ 325.820.386
	5 Geotecnia	\$ 134.544.425	\$ 134.544.425		\$ 134.544.425	\$ 134.544.425	\$ 0	\$ 134.544.425
	6 Diseño Estructural	\$ 173.744.511	\$ 86.872.256		\$ 86.872.256	\$ 86.872.256	\$ 0	\$ 86.872.256
	7 Redes de servicios	\$ 179.201.369	\$ 220.555.531		\$ 220.555.531	\$ 220.555.531	\$ 0	\$ 220.555.531
	8 Pavimentos	\$ 65.484.054	\$ 65.484.054		\$ 65.484.054	\$ 65.484.054	\$ 0	\$ 65.484.054
	9 Plan Manejo de Tránsito	\$ 41.012.555	\$ 41.012.555		\$ 41.012.555	\$ 41.012.555	\$ 0	\$ 41.012.555
	10 Lineamientos Ambientales	\$ 51.984.054	\$ 51.984.054		\$ 51.984.054	\$ 51.984.054	\$ 0	\$ 51.984.054
	11 Presupuesto, Especificaciones	\$ 70.227.566	\$ 70.227.566		\$ 70.227.566	\$ 70.227.566	\$ 0	\$ 70.227.566
	12 Gestión Social y Predial	\$ 186.242.359	\$ 137.955.047		\$ 137.955.047	\$ 137.955.047	\$ 0	\$ 137.955.047
Suma proyecto:		\$ 1.646.100.000	\$ 1.381.988.400		\$ 1.381.988.400	\$ 1.381.988.400	\$ 0	\$ 1.381.988.400
P3. Diseños arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería para el Malecón del Río Grande de La Magdalena, y de áreas para equipamientos públicos sobre este corredor.	1 Topografía	\$ 28.013.347	\$ 33.751.020		\$ 33.751.020	\$ 33.751.020	\$ 0	\$ 33.751.020
	2 Movilidad y tránsito	\$ 30.380.945	\$ 45.571.418		\$ 45.571.418	\$ 45.571.418	\$ 0	\$ 45.571.418
	3 Diseño Geométrico	\$ 42.444.882	\$ 42.444.882		\$ 42.444.882	\$ 42.444.882	\$ 0	\$ 42.444.882
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 1.004.357.626	\$ 1.378.782.149		\$ 1.378.782.149	\$ 965.147.505	\$ 413.634.644	\$ 1.378.782.149
	5 Geotecnia	\$ 69.080.222	\$ 177.634.857		\$ 177.634.857	\$ 177.634.857	\$ 0	\$ 177.634.857
	6 Diseño Estructural	\$ 120.726.795	\$ 313.889.667		\$ 313.889.667	\$ 200.000.000	\$ 113.889.667	\$ 313.889.667
	7 Redes de servicios	\$ 122.565.129	\$ 232.873.745		\$ 232.873.745	\$ 140.000.000	\$ 92.873.745	\$ 232.873.745
	8 Pavimentos	\$ 42.021.309	\$ 75.638.356		\$ 75.638.356	\$ 68.074.520	\$ 7.563.836	\$ 75.638.356
	9 Lineamientos Ambientales	\$ 38.362.920	\$ 57.775.482		\$ 57.775.482	\$ 57.775.482	\$ 0	\$ 57.775.482
	10 Presupuesto, Especificaciones	\$ 48.636.652	\$ 66.768.396		\$ 66.768.396	\$ 40.000.000	\$ 26.768.396	\$ 66.768.396
	11 Gestión Social y Predial	\$ 101.593.673	\$ 101.593.673		\$ 101.593.673	\$ 50.796.837	\$ 50.796.836	\$ 101.593.673
	12 Urbanismo, estudio bioclimático y amoblamiento interior			\$ 180.000.000	\$ 180.000.000		\$ 180.000.000	\$ 180.000.000




Proyecto	Producto	Valor Condición Inicial	Valor Acta Mayores y Menores Cantidades No 2	Adicional en Valor No 3	Valor Actualizado a la fecha	Valor Acumulado a Acta 05	Valor Acta Final	Valor Acumulado Acta Final
P4. Diseño urbanístico del espacio público de la Villa Olímpica y diseño de un Centro Polifuncional de Eventos	Suma proyecto:	\$ 1.648.183.500	\$ 2.526.723.645	\$ 180.000.000	\$ 2.706.723.645	\$ 1.821.196.520	\$ 885.527.124	\$ 2.706.723.645
	1 Topografía	\$ 31.633.747	\$ 40.860.257		\$ 40.860.257	\$ 40.860.257	\$ 0	\$ 40.860.257
	2 Movilidad y tránsito	\$ 28.563.238	\$ 28.563.238		\$ 28.563.238	\$ 28.563.238	\$ 0	\$ 28.563.238
	3 Diseño Geométrico	\$ 39.626.856	\$ 56.392.064		\$ 56.392.064	\$ 56.392.064	\$ 0	\$ 56.392.064
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 976.958.089	\$ 1.185.940.139		\$ 1.185.940.139	\$ 1.126.643.132	\$ 59.297.007	\$ 1.185.940.139
	5 Geotecnia	\$ 75.316.553	\$ 75.316.553		\$ 75.316.553	\$ 75.316.553	\$ 0	\$ 75.316.553
	6 Diseño Estructural	\$ 195.799.559	\$ 212.116.189		\$ 212.116.189	\$ 180.298.791	\$ 31.817.428	\$ 212.116.189
	7 Redes de servicios	\$ 138.414.911	\$ 168.650.480		\$ 168.650.480	\$ 151.785.432	\$ 16.865.048	\$ 168.650.480
	8 Pavimentos	\$ 35.061.373	\$ 49.895.031		\$ 49.895.031	\$ 49.895.031	\$ 0	\$ 49.895.031
	9 Lineamientos Ambientales	\$ 30.806.833	\$ 39.792.159		\$ 39.792.159	\$ 39.792.159	\$ 0	\$ 39.792.159
P5. Diseño arquitectónico y de ingeniería para el Centro Administrativo Municipal (CAM) y el Archivo Municipal de Barrancabermeja	10 Presupuesto. Especificaciones	\$ 76.005.840	\$ 92.264.323		\$ 92.264.323	\$ 92.264.323	\$ 0	\$ 92.264.323
	Suma proyecto:	\$ 1.628.187.000	\$ 1.949.790.433		\$ 1.949.790.433	\$ 1.841.810.950	\$ 107.979.483	\$ 1.949.790.433
	1 Topografía	\$ 31.956.966	\$ 38.516.871		\$ 38.516.871	\$ 38.516.871	\$ 0	\$ 38.516.871
	2 Movilidad y tránsito	\$ 30.277.048	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	3 Diseño Geométrico	\$ 49.685.880	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 1.043.848.778	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	5 Geotecnia	\$ 114.618.163	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	6 Diseño Estructural	\$ 292.039.487	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	7 Redes de servicios	\$ 346.686.471	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	8 Pavimentos	\$ 40.858.964	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
P6. Diseño arquitectónico y de ingeniería para el Centro de Rehabilitación de Farmacodependientes para el Municipio de Barrancabermeja.	9 Lineamientos Ambientales	\$ 45.583.964	\$ 22.791.982		\$ 22.791.982	\$ 22.791.982	\$ 0	\$ 22.791.982
	10 Presupuesto. Especificaciones	\$ 119.335.778	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Suma proyecto:	\$ 2.114.891.500	\$ 61.308.853		\$ 61.308.853	\$ 61.308.853	\$ 0	\$ 61.308.853
	1 Topografía	\$ 8.605.544	\$ 12.047.762		\$ 12.047.762	\$ 8.605.544	\$ 3.442.218	\$ 12.047.762
	2 Movilidad y tránsito	\$ 9.849.473	\$ 9.849.473		\$ 9.849.473	\$ 9.849.473	\$ 0	\$ 9.849.473
	3 Diseño Geométrico	\$ 13.056.008	\$ 13.056.008		\$ 13.056.008	\$ 34.816.021	\$ 21.760.013	\$ 13.056.008
	4 Arquitectura y urbanismo	\$ 114.555.861	\$ 179.382.128		\$ 179.382.128	\$ 165.916.896	\$ 13.465.232	\$ 179.382.128
	5 Geotecnia	\$ 42.397.680	\$ 42.397.680		\$ 42.397.680	\$ 50.000.000	\$ 7.602.320	\$ 42.397.680
	6 Diseño Estructural	\$ 74.849.397	\$ 104.789.156		\$ 104.789.156	\$ 88.712.349	\$ 16.076.807	\$ 104.789.156
	7 Redes de servicios	\$ 78.352.470	\$ 109.693.458		\$ 109.693.458	\$ 99.176.235	\$ 10.517.223	\$ 109.693.458
P7. Diseño arquitectónico y de ingeniería de una cubierta para polideportivos en espacio público y su manual de implementación a futuras aplicaciones	8 Pavimentos	\$ 13.834.874	\$ 13.834.874		\$ 13.834.874	\$ 13.834.874	\$ 0	\$ 13.834.874
	9 Lineamientos Ambientales	\$ 17.614.874	\$ 52.844.622		\$ 52.844.622	\$ 70.459.496	\$ 17.614.874	\$ 52.844.622
	10 Presupuesto. Especificaciones	\$ 36.187.819	\$ 50.662.947		\$ 50.662.947	\$ 40.000.000	\$ 10.662.947	\$ 50.662.947
	Suma proyecto:	\$ 409.304.000	\$ 588.558.107		\$ 588.558.107	\$ 581.370.888	\$ 17.187.218	\$ 588.558.107
	1 Topografía	\$ 10.094.765	\$ 8.580.550		\$ 8.580.550	\$ 8.580.550	\$ 0	\$ 8.580.550
	2 Arquitectura y urbanismo	\$ 270.873.983	\$ 334.529.369		\$ 334.529.369	\$ 334.529.369	\$ 0	\$ 334.529.369
	3 Geotecnia	\$ 34.805.411	\$ 34.805.411		\$ 34.805.411	\$ 34.805.411	\$ 0	\$ 34.805.411
	4 Diseño Estructural	\$ 165.165.889	\$ 294.545.835		\$ 294.545.835	\$ 294.545.835	\$ 0	\$ 294.545.835
	5 Presupuesto. Especificaciones	\$ 26.888.452	\$ 47.951.073		\$ 47.951.073	\$ 47.951.073	\$ 0	\$ 47.951.073
	Suma proyecto:	\$ 507.828.500	\$ 720.412.238		\$ 720.412.238	\$ 720.412.238	\$ 0	\$ 720.412.238
P8. Diseños arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería de la fachada, área administrativa y talleres del Instituto Técnico Superior Industrial (ITSI).	1 Topografía	\$ 17.792.992	\$ 20.334.848		\$ 20.334.848	\$ 20.334.848	\$ 0	\$ 20.334.848
	2 Movilidad y tránsito	\$ 10.605.849	\$ 10.605.849		\$ 10.605.849	\$ 10.605.849	\$ 0	\$ 10.605.849
	3 Arquitectura y urbanismo	\$ 400.886.671	\$ 620.934.510		\$ 620.934.510	\$ 416.109.602	\$ 204.824.908	\$ 620.934.510
	4 Geotecnia	\$ 53.318.019	\$ 53.318.019		\$ 53.318.019	\$ 53.318.019	\$ 0	\$ 53.318.019
	5 Diseño Estructural	\$ 146.498.048	\$ 268.579.755		\$ 268.579.755	\$ 214.863.804	\$ 53.715.951	\$ 268.579.755
	6 Redes de servicios	\$ 103.653.668	\$ 190.031.725		\$ 190.031.725	\$ 190.031.725	\$ 0	\$ 190.031.725
	7 Pavimentos	\$ 19.772.055	\$ 19.772.055		\$ 19.772.055	\$ 19.772.055	\$ 0	\$ 19.772.055

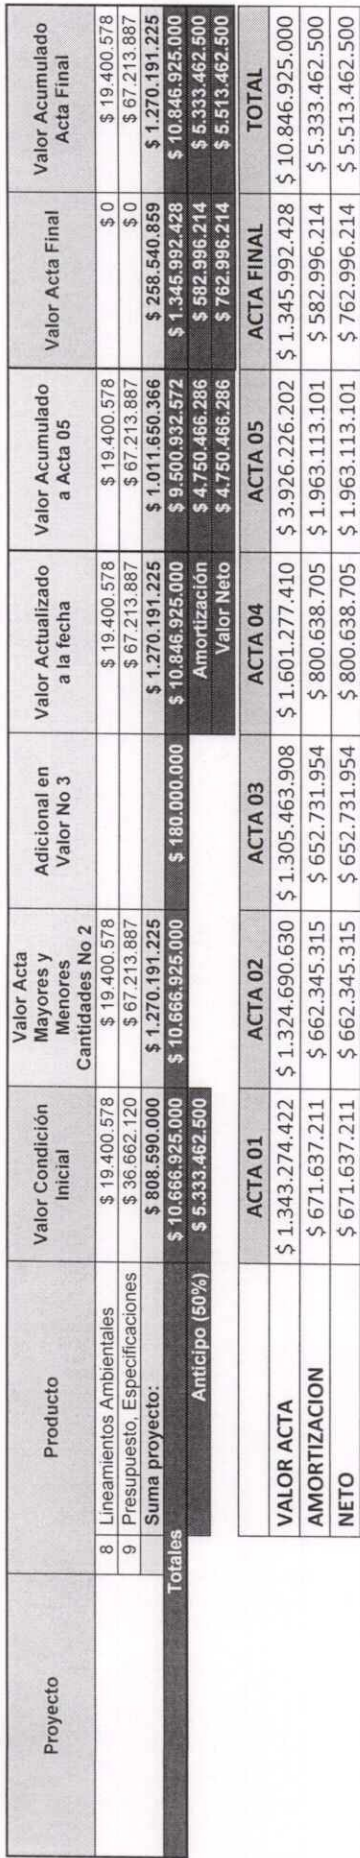

Jessica Baron Guarín
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Barrancabermeja


GERMAN GARCIA VERA
Director Escuela de Ingeniería Civil
Universidad Industrial de Santander

Epid
ENILDO JIMENEZ GONZALEZ
Profesional Universitario- Apoyo
Municipio de Barrancabermeja


HERNÁN PORRAS DÍAZ
Director del Proyecto
Universidad Industrial de Santander

Vo.Bo. A. Gómez.- A. Contables
Vo.Bo. Diana L. - A. Jurídicos
